

| CONTRATO | | 6.020/2023 |
|-----------------------------|--|------------|
| EMPRESA | AGILIS CONSTRUTORA LTDA | |
| DATA ASSINATURA DO CONTRATO | 27/03/2023 | |
| OBJETO | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM COM A UTILIZAÇÃO DE TUBOS DE PEAD, E COBERTURA COM PAVIMENTO RÍGIDO OU FLEXÍVEL. LOTE III | |
| LOCAL | Rua Professor Evaldo Altino | |
| Nº CONTRATO | 6.020/2023 | |
| PROCESSO Nº | 06.04313.5.22 | |
| STATUS | OBRA EM ANDAMENTO | |



A obra de drenagem e pavimentação da Rua Professor Evaldo Altino, entre a Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira e a Rua Conselheiro Silveira de Souza, está em andamento desde 20 de novembro de 2023, com previsão de término para 31 de julho de 2024. Esta obra, que abrange uma extensão de 575 metros e uma área total de 4.473,06 m², encontra-se atualmente na fase de execução, com 75% dos serviços já concluídos.

Até o momento, foram executados 409,20 metros da rede de drenagem, o que representa 100% do total previsto no contrato. A etapa da pavimentação está com 74% dos serviços executados, restando 1.192,06 m² de paralelepípedos a serem assentados e 72,86 metros de guias (meio-fio) a serem instaladas.

A obra enfrentou desafios que impactaram seu ritmo, incluindo a necessidade de revisão do projeto para garantir a qualidade dos serviços de drenagem e pavimentação, bem como as condições climáticas adversas que afetaram a execução dos trabalhos. Contudo, a obra está dentro do cronograma e o término está previsto conforme este cronograma, assegurando que todos os serviços serão finalizados com a devida qualidade e conforme as especificações técnicas estabelecida

Assim, a obra de drenagem e pavimentação da Rua Professor Evaldo Altino continua progredindo de acordo com o planejado, com a expectativa de conclusão dentro do prazo previsto, garantindo uma infraestrutura adequada e durável para a comunidade.

Segue abaixo o projeto da obra em questão:

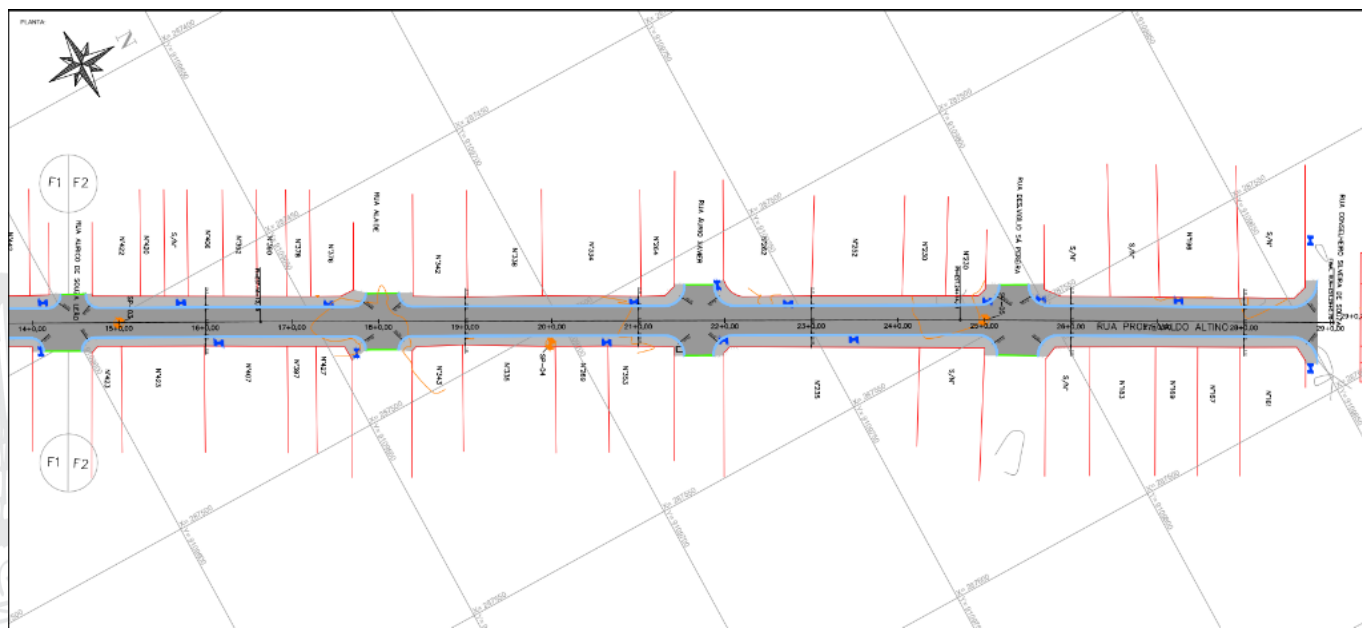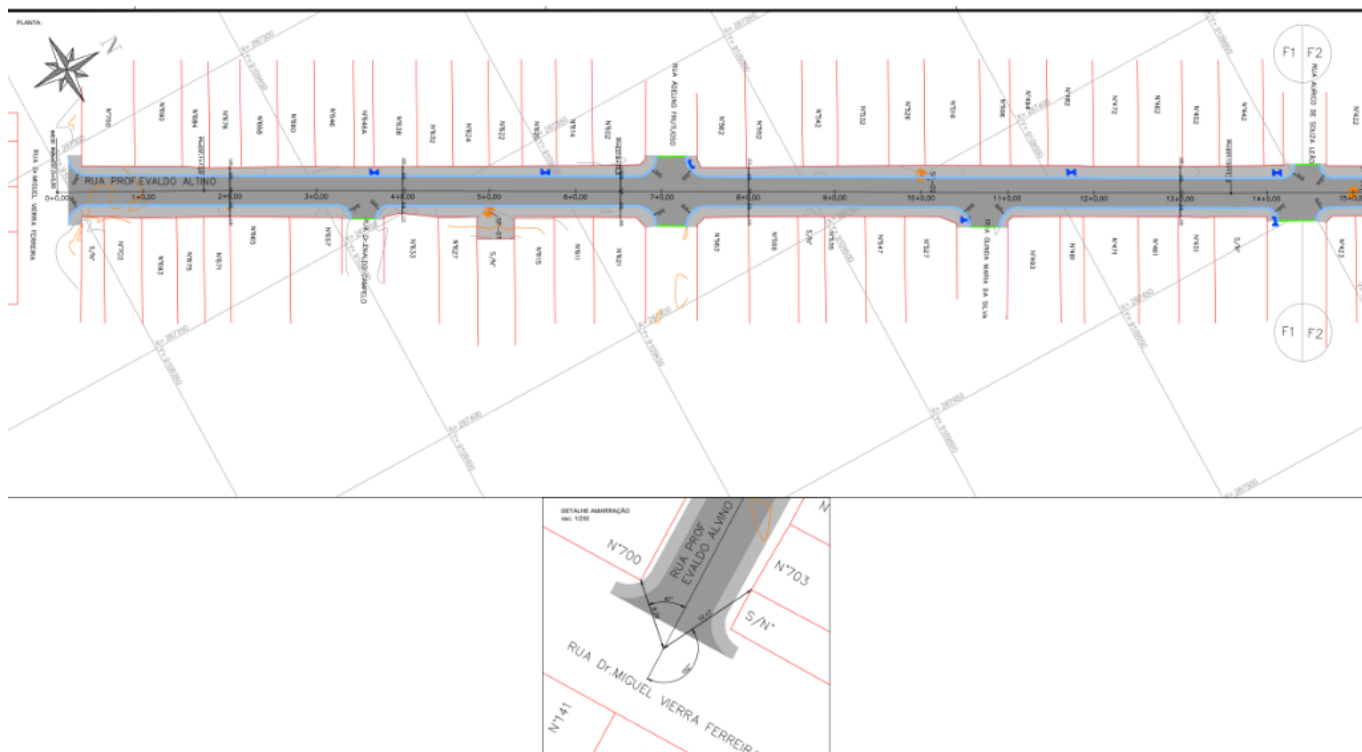

Relatório Fotográfico



Obra: Placa de Obra da Rua Professor Evaldo Altino.



Obra: Execução da Rua Professor Evaldo Altino.



Obra: Execução da Rua Professor Evaldo Altino.



Obra: Execução da Rua Professor Evaldo Altino.



Obra: Execução da Rua Professor Evaldo Altino.



Obra: Execução da Rua Professor Evaldo Altino.



Obra: Execução da Rua Professor Evaldo Altino.



Obra: Execução da Rua Professor Evaldo Altino.

Atenciosamente,

LUCAS FELIPE FERREIRA

Gerente Geral de Obras

JULLIANA LINS DA SILVEIRA AUEIZ

Diretora Executiva de Projetos e Obras
